

№	Название задачи	дней	Начало	Окончание	Пред	май	01 Сентябрь		01 Январь		01 Май		01 Сентябрь		01 Январь		01 Май	
						08.06	03.08	28.09	23.11	18.01	14.03	09.05	04.07	29.08	24.10	19.12	13.02	10.04
1	ГАЗ	0	Ср 09.09.15	Ср 09.09.15														
2	Газ. Подача заявки на получение ТУ по газоснабжению	12	Ср 09.09.15	Чт 24.09.15	1													
3	Газ. Получение ТУ по газоснабжению	30	Пт 25.09.15	Чт 05.11.15	2													
4	Газ. Проектирование	40	Пт 06.11.15	Чт 31.12.15	3													
5	Газ. Определения места установки газа распределительного шкафа (ГРШ)	31	Пт 06.11.15	Пт 18.12.15	3													
6	Газ. Согласование проекта по газификации	31	Пт 01.01.16	Пт 12.02.16	4;5													
7	Газ. Строительство газопровода 1,2 очереди	30	Ср 02.03.16	Вт 12.04.16	6;15													
8	Газ. Строительство газопровода 3 очередь	30	Пт 11.11.16	Чт 22.12.16	7;16													
9	Газ. Согласование построенного Газопровода	30	Пт 23.12.16	Чт 02.02.17	8;7													
10	Газ. Пуска- наладочные работы	30	Пт 03.02.17	Чт 16.03.17	9													
11	Газ. Получение Акта Законченного строительства Газопровода	20	Пт 17.03.17	Чт 13.04.17	10													
12	ВОДА	0	Пн 21.12.15	Пн 21.12.15														
13	Вода. Определение места скважины и установки насосного оборудования	30	Пн 21.12.15	Пт 29.01.16	12;5													
14	Вода. Бурение скважины с водой	14	Пн 01.02.16	Чт 18.02.16	13													
15	Вода. Получение паспорта на скважину	22	Пн 01.02.16	Вт 01.03.16	13													
16	Вода. Строительство водопровода 1,2 очереди	30	Ср 02.03.16	Вт 12.04.16	15;6													
17	Вода. Пуска- наладочные работы 1,2 очереди	14	Ср 13.04.16	Пн 02.05.16	16													
18	Вода. Строительство водопровода 3 очередь	30	Пт 11.11.16	Чт 22.12.16	7;16													

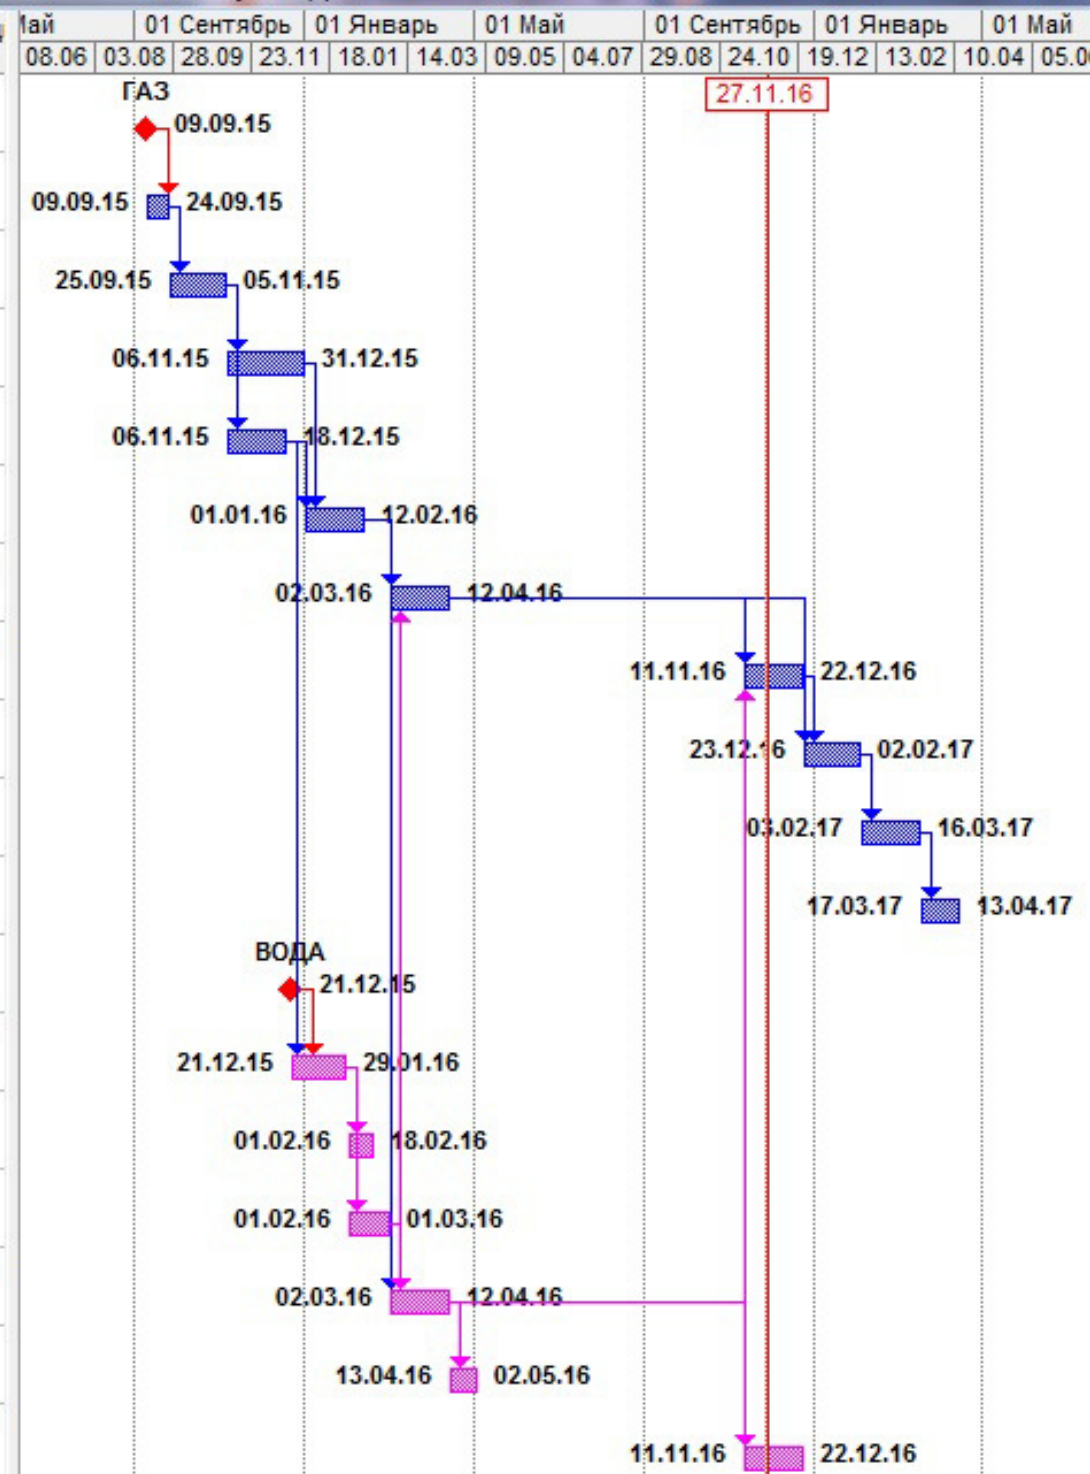




Диаграмма Ганта

№	Название задачи	дней	Начало	Окончание	Пред	январь	01 Май		01 Сентябрь		01 Январь		01 Май		01 Сентябрь		01	
						16.02	13.04	08.06	03.08	28.09	23.11	18.01	14.03	09.05	04.07	29.08	24.10	19.
19	СВЕТ 15 кВт	0	Вт 16.06.15	Вт 16.06.15														
20	Свет 15 кВт. Заявка на предоставление ТУ по электрификации	34	Вт 16.06.15	Пт 31.07.15	19													
21	Свет 15 кВт. Запрос на договор о предоставлении электричества	34	Вт 16.06.15	Пт 31.07.15	19													
22	Свет 15 кВт. Получение договора	14	Пн 03.08.15	Чт 20.08.15	21													
23	Свет 15 кВт. Получение ТУ по электрификации	14	Пн 03.08.15	Чт 20.08.15	20													
24	Свет 15 кВт. Определение точки подключения к действующим электрическим сетям	20	Пт 21.08.15	Чт 17.09.15	23													
25	Свет 15 кВт. Согласование точки подключения к ДЭС	20	Пт 18.09.15	Чт 15.10.15	24													
26	Свет 15 кВт. Согласовать трассу с собственником соседнего участка	20	Пт 18.09.15	Чт 15.10.15	24													
27	Свет 15 кВт. Согласовать трассу с газовой службой	20	Пт 18.09.15	Чт 15.10.15	24													
28	Свет 15 кВт. Строительство физ. линии - устан.: столбов, проводов, трансформатора	40	Пт 16.10.15	Чт 10.12.15	24;25													
29	Свет 15 кВт. Получение акта технологического присоединения	10	Пт 11.12.15	Чт 24.12.15	28													
30	Свет 15 кВт. Подача док-ов (акт, ТУ, дог-р) в сбыт. компанию. для получ. счета и факт. включения.	20	Пт 25.12.15	Чт 21.01.16	22;23													
31	Свет 15 кВт. Получение документов из сбытовой компании	3	Пт 22.01.16	Вт 26.01.16	30													
32	Свет 15 кВт. По желанию подача пакета заявок на увеличение мощности	3	Ср 27.01.16	Пт 29.01.16	31													

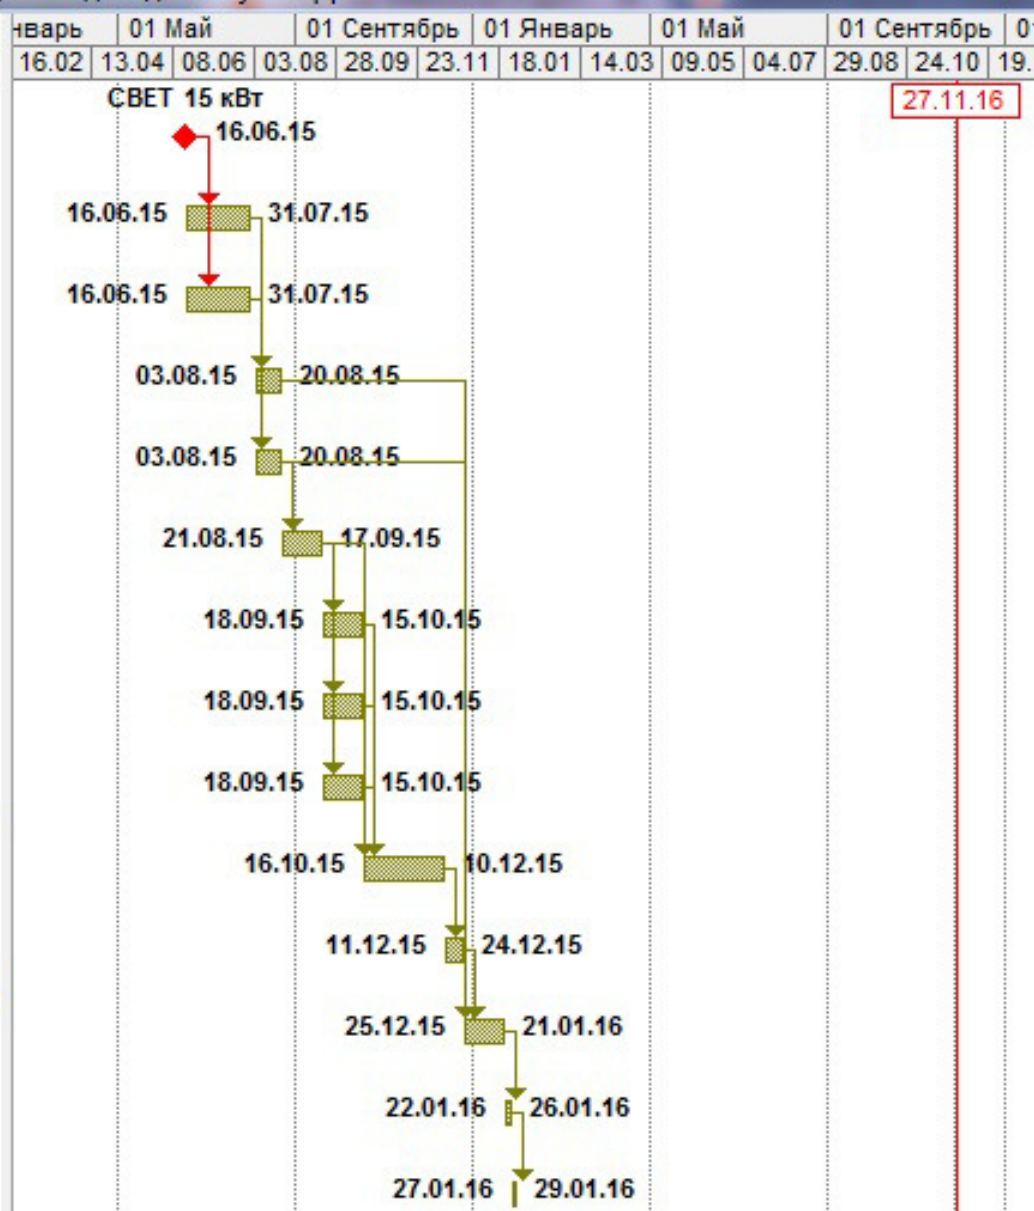


Диаграмма Ганта

ИД	Название задачи	дней	Начало	Окончание	Пред	01 Сентябрь		01 Январь		01 Май		01 Сентябрь		01 Январь		01 Май		01 Сентябрь	
						01.09	27.10	22.12	16.02	13.04	08.06	03.08	28.09	23.11	18.01	14.03	09.05	04.07	29.08
33	ДОРОГА	0	Вт 11.08.15	Вт 11.08.15															
34	Дорога. Пред проектные предложения.	5	Вт 11.08.15	Пн 17.08.15	33														
35	Дорога. Трассировка тела дороги на местности.	3	Вт 18.08.15	Чт 20.08.15	34														
36	Дорога. Коррекция трасс на местности с учетом рельефа.	3	Пт 21.08.15	Вт 25.08.15	35														
37	Дорога. Создание проекта дорог и проездов.	5	Ср 26.08.15	Вт 01.09.15	36														
38	Дорога. Строительство подъездных путей 2100 метров	41	Ср 02.09.15	Ср 28.10.15	37														
39	Дорога. Строительство парковок, развязов, благоустройство обочин	10	Чт 29.10.15	Ср 11.11.15	38														
40	ДОКУМЕНТЫ 1,2 очередь	0	Вт 20.01.15	Вт 20.01.15															
41	Документы на землю. Предварительный план разбивки территории	4	Вт 20.01.15	Пт 23.01.15	40														
42	Документы на землю. Отрисовка Ген плана застройки территории.	3	Пн 26.01.15	Ср 28.01.15	41														
43	Документы на землю. Вынос участков на местности	3	Чт 29.01.15	Пн 02.02.15	42														
44	Документы на землю. Коррекция выноса и раздела	3	Вт 03.02.15	Чт 05.02.15	43														
45	Документы на землю. Подготовка межевых дел на раздел.	10	Пт 06.02.15	Чт 19.02.15	44														
46	Документы на землю. Подача межевых дел в кадастровую палату	3	Пт 20.02.15	Вт 24.02.15	45														
47	Документы на землю. Постановка на кадастровый учет	14	Ср 25.02.15	Пн 16.03.15	46														
48	Документы на землю. Получение из кад палаты новых кад паспортов	3	Вт 17.03.15	Чт 19.03.15	47														
49	Документы на землю. Подача решения о разделе в ФРС	3	Пт 20.03.15	Вт 24.03.15	48														
50	Документы на землю. Гос. регистрация раздела	14	Пт 20.03.15	Ср 08.04.15	48														
51	Документы на землю. Получение Выписок из ЕГРП	3	Чт 09.04.15	Пн 13.04.15	50														

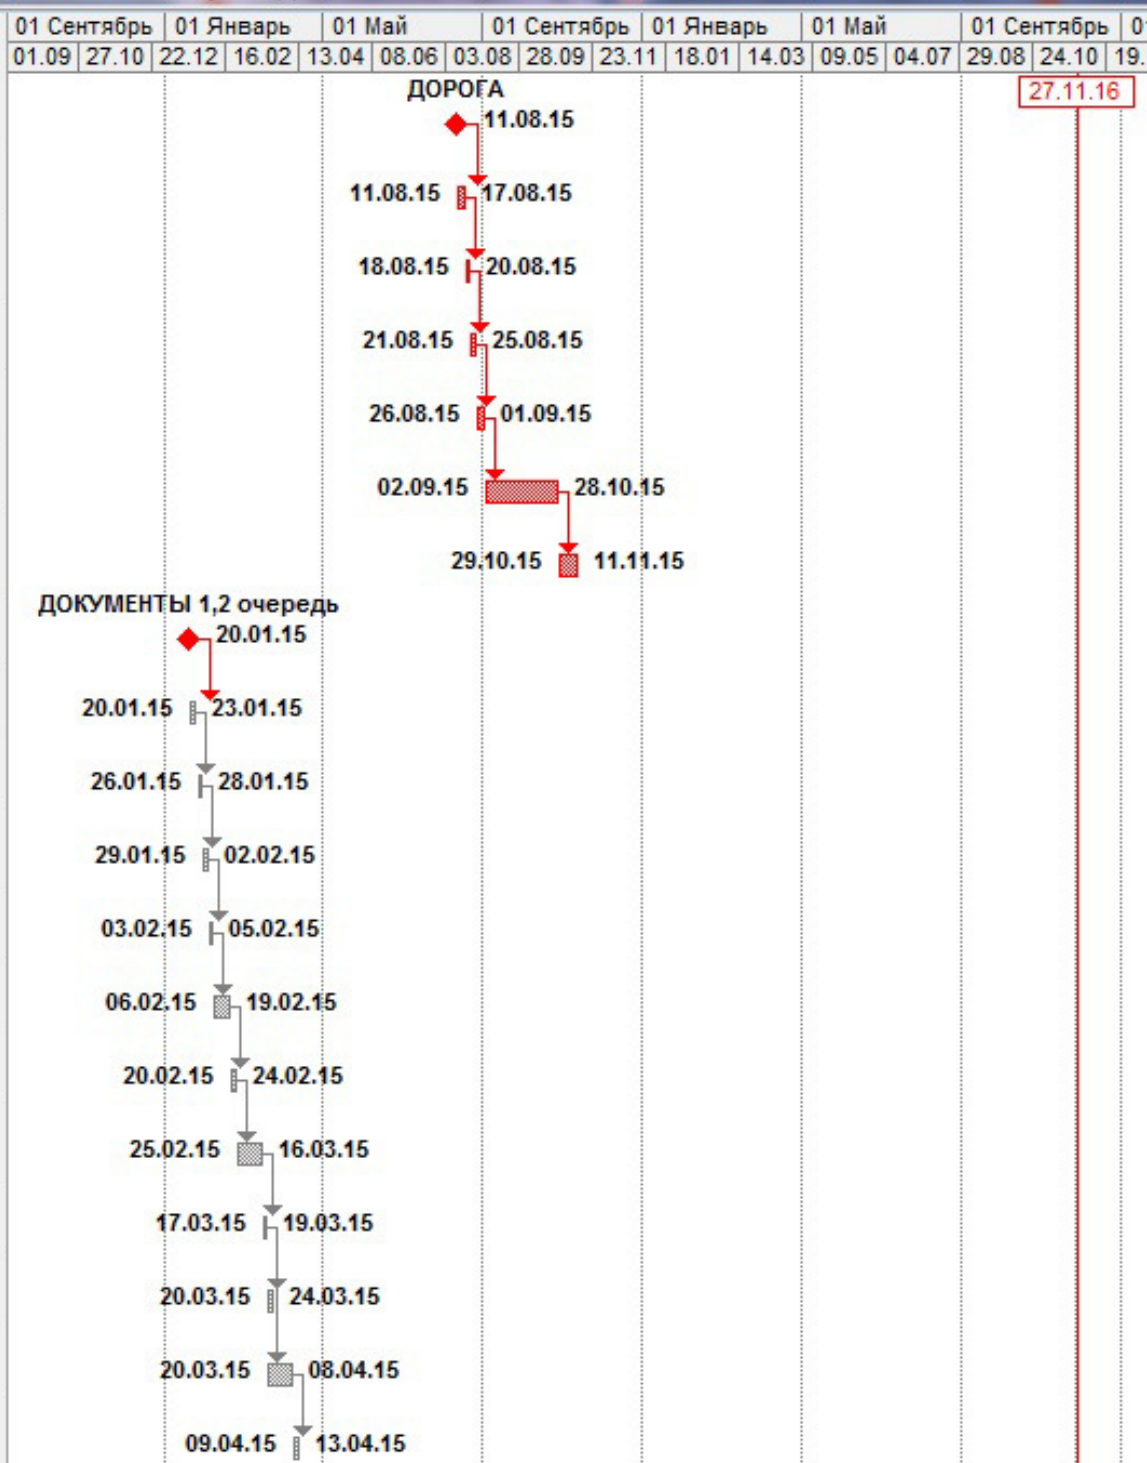




Диаграмма Ганта

Идентификатор	Название задачи	длительность	Начало	Окончание	Предшественник	Среда	01 Май	01 Сентябрь	01 Январь
						14.03	09.05	04.07	29.08
52	ДОКУМЕНТЫ 3 очередь	0 дней	Ср 20.07.16	Ср 20.07.16					
53	Документы на землю. Предварительный план разбивки территории	4 дней	Ср 20.07.16	Пн 25.07.16	52				
54	Документы на землю. Отрисовка Ген плана застройки территории.	14 дней	Вт 26.07.16	Пт 12.08.16	53				
55	Документы на землю. Вынос участков на местности	3 дня	Пн 15.08.16	Ср 17.08.16	54				
56	Документы на землю. Коррекция выноса и раздела	3 дня	Чт 18.08.16	Пн 22.08.16	55				
57	Документы на землю. Подготовка межевых дел на раздел.	20 дней	Вт 23.08.16	Пн 19.09.16	56				
58	Документы на землю. Постановка на кадастровый учет	14 дней	Пт 25.11.16	Ср 14.12.16	57				
59	Документы на землю. Получение из кад палаты новых кад паспортов	3 дня	Чт 15.12.16	Пн 19.12.16	58				
60	Документы на землю. Подача решения о разделе в ФРС	3 дня	Вт 20.12.16	Чт 22.12.16	59				
61	Документы на землю. Гос. регистрация раздела	14 дней	Вт 20.12.16	Пт 06.01.17	59				
62	Документы на землю. Получение Выписок из ЕГРП	3 дня	Пн 09.01.17	Ср 11.01.17	61				

