Microsoft Project - КП Центральное Раздолье. Водоснабжение. Электрификация. Подъездные пути.mpp

Диаграмма Ганта

	Название задачи	Длительность	Начало	Окончание	Предш
1	ВОДА	0 дней	Пн 03.04.17	Пн 03.04.17	
2	Вода. Определение места скважины и установки насосного оборудования	30 дней	Пн 03.04.17	Пт 12.05.17	1
3	Вода. Бурение скважины с водой	14 дней	Пн 15.05.17	Чт 01.06.17	2
4	Вода. Получение паспорта на скважину	22 дней	Пн 15.05.17	Вт 13.06.17	2
5	Вода. Строительство водопровода	30 дней	Ср 14.06.17	Вт 25.07.17	4
6	СВЕТ 15 кВт	0 дней	Чт 16.06.16	Чт 16.06.16	
7	Свет 15 кВт. Заявка на предоставление ТУ по электрификации	34 дней	Чт 16.06.16	Вт 02.08.16	6
8	Свет 15 кВт. Запрос на договор о предоставлении электричества	34 дней	Чт 16.06.16	Вт 02.08.16	6
9	Свет 15 кВт. Получение договора	20 дней	Ср 03.08.16	Вт 30.08.16	8
10	Свет 15 кВт. Получение ТУ по электрификации	20 дней	Ср 03.08.16	Вт 30.08.16	7
11	Свет 15 кВт. Определение точки подключения к действующим электрическим сетям	20 дней	Ср 31.08.16	Вт 27.09.16	10
12	Свет 15 кВт. Согласование точки подключения к ДЭС	20 дней	Ср 28.09.16	Вт 25.10.16	11
13	Свет 15 кВт. Согласовать трассу с собственником соседнего участка	20 дней	Ср 28.09.16	Вт 25.10.16	11
14	Свет 15 кВт. Согласовать трассу с газовой службой	20 дней	Ср 28.09.16	Вт 25.10.16	11
15	Свет 15 кВт. Строительство физ. лини - устан.: столбов, проводов, трансформатора	41 дней	Ср 26.10.16	Ср 21.12.16	11;12;
16	Свет 15 кВт. Получение акта технологического присоединения	10 дней	Чт 22.12.16	Ср 04.01.17	15
17	Свет 15 кВт. Подача док-ов (акт, ТУ, дог-р) в сбыт. компанию. для получ. счета и факт. включения.	20 дней	Чт 05.01.17	Ср 01.02.17	9;10;1
18	Свет 15 кВт. Получение документов из сбытовой компании	1 день	Чт 02.02.17	Чт 02.02.17	17
19	Свет 15 кВт. По желанию подача пакета заявок на увеличение мощности	1 день	Пт 03.02.17	Пт 03.02.17	18

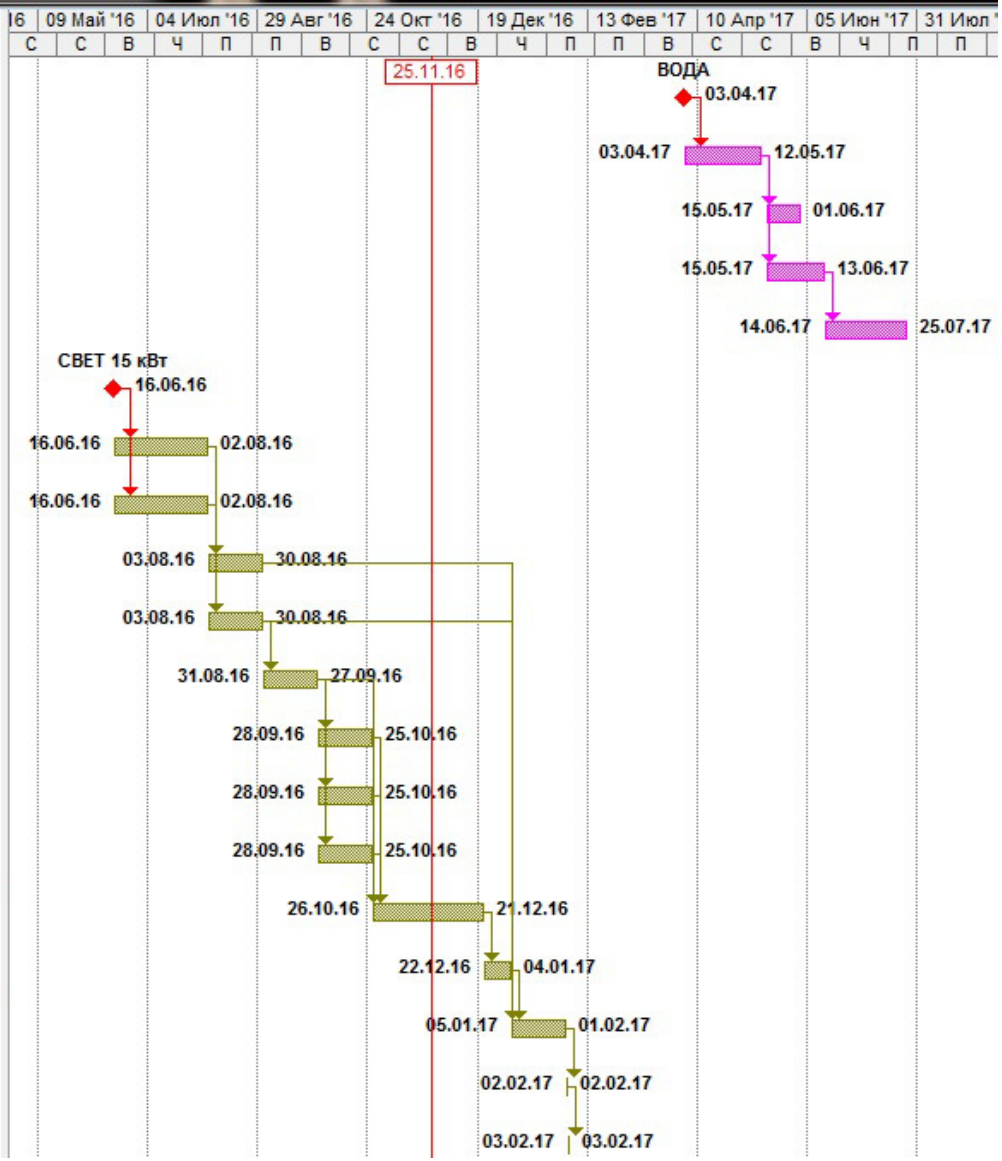

Microsoft Project - КП Центральное Раздолье. Водоснабжение. Электрификация. Подъездные пути.mpp

Диаграмма Ганта
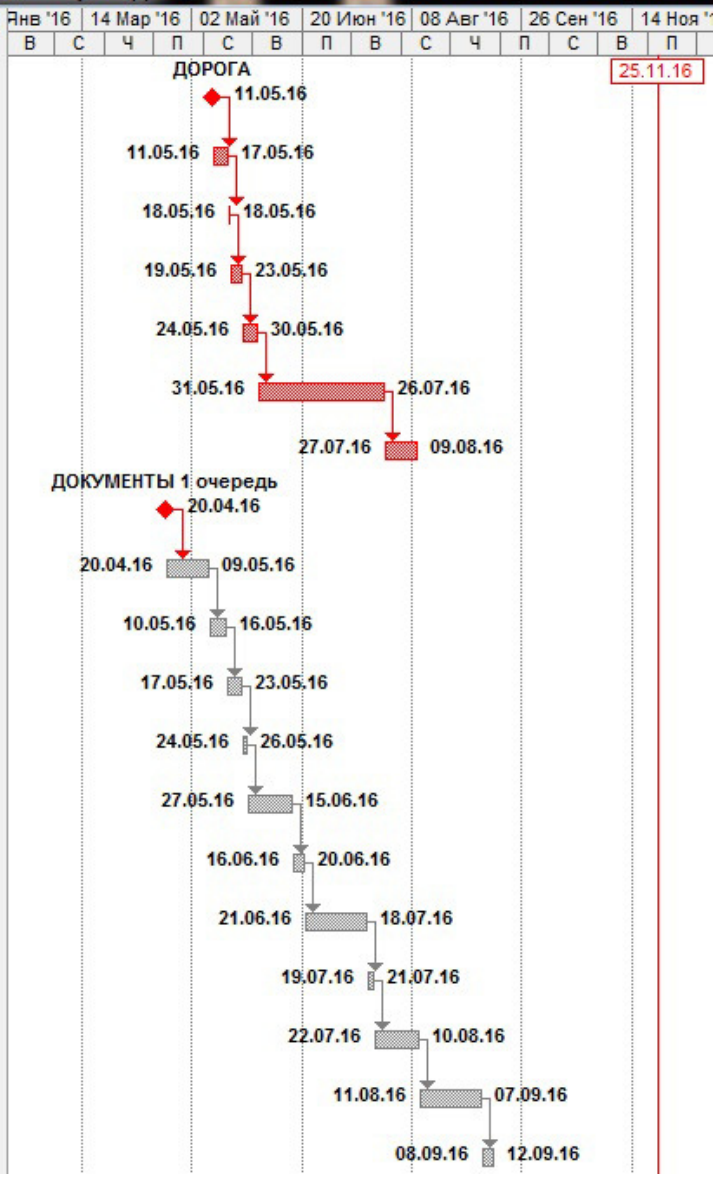
	Название задачи	тельн	Начало	Окончани	Преди
20	ДОРОГА	0 дней	Ср 11.05.16	Ср 11.05.16	
21	Дорога. Пред проектные предложения.	5 дней	Ср 11.05.16	Вт 17.05.16	20
22	Дорога. Трассировка тела дороги на местности.	1 день	Ср 18.05.16	Ср 18.05.16	21
23	Дорога. Коррекция трасс на местности с учетом рельефа.	3 дней	Чт 19.05.16	Пн 23.05.16	22
24	Дорога. Создание проекта дорог и проездов.	5 дней	Вт 24.05.16	Пн 30.05.16	23
25	Дорога. Строительство подъездных путей	41 дней	Вт 31.05.16	Вт 26.07.16	24
26	Дорога. Строительство парковок, разъездов, благоустройство обочин	10 дней	Ср 27.07.16	Вт 09.08.16	25
27	ДОКУМЕНТЫ 1 очередь	0 дней	Ср 20.04.16	Ср 20.04.16	
28	Документы на землю. Предварительный план разбивки территории	14 дней	Ср 20.04.16	Пн 09.05.16	27
29	Документы на землю. Отрисовка Ген плана застройки территории.	5 дней	Вт 10.05.16	Пн 16.05.16	28
30	Документы на землю. Вынос участков на местности	5 дней	Вт 17.05.16	Пн 23.05.16	29
31	Документы на землю. Коррекция выноса и раздела	3 дней	Вт 24.05.16	Чт 26.05.16	30
32	Документы на землю. Подготовка межевых дел на раздел.	14 дней	Пт 27.05.16	Ср 15.06.16	31
33	Документы на землю. Подача межевых дел в кадастровую палату	3 дней	Чт 16.06.16	Пн 20.06.16	32
34	Документы на землю. Постановка на кадастровый учет	20 дней	Вт 21.06.16	Пн 18.07.16	33
35	Документы на землю. Получение из кад палаты новых кад паспортов	3 дней	Вт 19.07.16	Чт 21.07.16	34
36	Документы на землю. Подача решения о разделе в ФРС	14 дней	Пт 22.07.16	Ср 10.08.16	35
37	Документы на землю. Гос. регистрация раздела	20 дней	Чт 11.08.16	Ср 07.09.16	36
38	Документы на землю. Получение Выписок из ЕГРП	3 дней	Чт 08.09.16	Пн 12.09.16	37
